

Identifikačný názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Štvrť																													
			2021 apr	2021 máj	2021 jún	2021 júl	2021 aug	2021 sep	2021 okt	2021 nov	2021 dec	2022 jan	2022 feb	2022 mar	2022 apr	2022 máj	2022 jún	2022 júl	2022 aug	2022 sep	2022 okt	2022 nov	2022 dec	2023 jan	2023 feb	2023 mar	2023 apr	2023 máj	2023 jún	2023 júl	2023 aug	2023 sep
Pruské – kanalizácia a čov	Po 3.5.21	Pi 28.4.23	[Gantt chart showing project progress with blue bars and arrows across the timeline grid]																													
Podpis ZOd	Po 3.5.21	Po 3.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Nadobudnutie účinnosti ZOD	Po 3.5.21	Po 3.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	Ut 4.5.21	Ut 4.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Zariadenie staveniska	Str 5.5.21	Po 10.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Projekt dopravného značenia	Ut 4.5.21	Po 17.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	Ut 4.5.21	Po 10.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Plán ochrany životného prostredia	Ut 4.5.21	Str 19.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Plán organizácie výstavby	Ut 4.5.21	Št 13.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Kontrolno skúšobný plán	Ut 4.5.21	Po 24.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Geodetické práce	Ut 11.5.21	Ut 18.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Informačná tabuľa , 3 kusy	Ut 11.5.21	Št 13.5.21	[Gantt chart showing progress]																													
Archeologický prieskum	Ut 11.5.21	Št 13.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Náhradná výsadba drevín	Po 3.4.23	Pi 21.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky	Pi 31.3.23	Št 20.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DS)	Po 21.11.22	Št 20.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Pamätná tabuľa - 1ks	Pi 7.4.23	Pi 7.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
Ostatné	Ut 4.5.21	Pi 28.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
SO 418 - Zberač B - Bohunice - Pruské	Po 6.6.22	Št 6.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
SO 418.1 Kanalizačná sieť	Po 6.6.22	Št 6.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
SO 418.2 Zaústenie kanalizačných prípojk	Po 13.6.22	Št 6.4.23	[Gantt chart showing progress]																													
SO 418.3 Dotknuté ochranného pásma dráhy (OPD)	Po 17.10.22	Pi 4.11.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419 - Kanalizačná sieť Bohunice	Ut 11.5.21	Pi 26.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.1. Kanalizačná sieť	Ut 11.5.21	Pi 26.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.2 Preložky	Ut 13.7.21	Str 30.11.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.2.1 Preložka STL plynovodu Bohunice	Ut 13.7.21	Po 18.10.21	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.2.2 Preložka vodovodu	Str 13.10.21	Ut 16.11.21	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.2.3 Preložka diaľkového kábla	Št 20.10.22	Str 30.11.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.3 - ČS B11	Ut 2.11.21	Str 6.4.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.3.1 Čerpacia stanica ČS B11 - stavebná časť	Ut 2.11.21	Pi 11.3.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.3.2 Pripojka NN pre ČS B11	Po 14.3.22	Str 6.4.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.4 - Zaústenie kanalizačných prípojk	Ut 18.5.21	Pi 26.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 419.4.1 Zaústenie kanalizačných prípojk	Ut 18.5.21	Pi 26.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 420 - Čerpacia stanica ČS B9	Po 6.6.22	Str 3.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 420.1 Čerpacia stanica ČS B9 - stavebná časť	Po 6.6.22	Pi 15.7.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 420.3 Pripojka NN pre ČS B9	Po 18.7.22	Str 27.7.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 420.4 Vodovodná pripojka pre ČS B9	Št 28.7.22	Str 3.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 421 Čerpacia stanica ČS B6	Po 18.7.22	Ut 13.9.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 421.1 Čerpacia stanica ČS B6 - stavebná časť	Po 18.7.22	Pi 26.8.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 421.3 Pripojka NN pre ČS B6	Po 29.8.22	Ut 6.9.22	[Gantt chart showing progress]																													
SO 421.4 Vodovodná pripojka pre ČS B6	Str 7.9.22	Ut 13.9.22	[Gantt chart showing progress]																													

Projekt: HMG Pruské
Dátum: Ut 9.2.21

Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Termin
Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Pribeh
Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Manuálny priebeh
Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	
Iba začiatok	Iba dokončiť	Externé úlohy	
Externé úlohy	Externý medzník		

Identifikačný názov úlohy	Štvrť: 2, 2021		Štvrť: 3, 2021		Štvrť: 4, 2021		Štvrť: 1, 2022		Štvrť: 2, 2022		Štvrť: 3, 2022		Štvrť: 4, 2022		Štvrť: 1, 2023		Štvrť: 2, 2023		Štvrť: 3, 2023	
	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov
SO 426.1 Kanalizačná sieť Pruské	Ut 11.5.21	Št 6.4.23																		
SO 426.1.1 Kanalizačná sieť	Ut 11.5.21	Št 6.4.23																		
SO 426.2 Prieťahy	Po 2.5.22	Pi 3.6.22																		
SO 426.2.1 Prieťah pripojovacieho plynovodu Pruské	Po 2.5.22	Pi 3.6.22																		
SO 426.3 Zaistenie kanalizačných pripojok	Ut 18.5.21	Št 6.4.23																		
SO 426.3.1 Zaistenie kanalizačných pripojok	Ut 18.5.21	Št 6.4.23																		
SO 427 Čerpadacia stanica ČS B7	Po 5.9.22	Ut 11.4.23																		
SO 427.1 Čerpadacia stanica ČS B7 - stavebná časť	Po 5.9.22	Pi 14.10.21																		
SO 427.3 Pripojka NN pre ČS B7	Po 17.10.22	Ut 15.11.22																		
SO 427.4 Vodovodná pripojka pre ČS B7	Št 16.11.22	Ut 22.11.22																		
SO 427.5 Prijazdová komunikácia k ČS B7	Št 17.11.22	Ut 11.4.23																		
SO 428 Čerpadacia stanica ČS B8	Po 16.5.22	Pi 15.7.22																		
SO 428.1 Čerpadacia stanica ČS B8 - stavebná časť	Po 16.5.22	Pi 24.6.22																		
SO 428.3 Pripojka NN pre ČS B8	Po 27.6.22	Št 6.7.22																		
SO 428.4 Vodovodná pripojka pre ČS B8	Št 7.7.22	Pi 15.7.22																		
SO 430 ČOV Pruské	Ut 4.5.21	Pi 28.4.23																		
SO 430.1 Zárúčený objekt ČOV	Ut 15.6.21	Št 23.11.22																		
SO 430.1.1 Zdrúžený objekt VČS, JSK a JKV	Pi 25.6.21	Št 12.8.21																		
SO 430.1.2 Hrubé predčistenie a odtokový žlab	Št 1.7.21	Št 11.8.21																		
SO 430.1.3 Obehové aktivačné nádrže	Ut 15.6.21	Pi 1.7.22																		
SO 430.1.4 Dosadzovacie nádrže	Ut 15.6.21	Pi 6.5.22																		
SO 430.1.5 Prevádzková budova s duchárnou a stabilizačnými nádržami	Pi 30.7.21	Št 23.11.22																		
SO 430.1.5.50 Vzduchotechnika	Ut 6.9.22	Po 31.10.22																		
SO 430.1.5.60 Zdravotne technické inštalácie	Št 21.7.21	Št 17.11.22																		
SO 430.1.6 Spojovacie potrubie a žlaby	Pi 6.8.21	Št 30.3.22																		
SO 430.1.6.1 Spojovacie potrubie	Pi 29.10.21	Št 23.3.22																		
SO 430.1.6.2 Rozdeľovací objekt OAN	Pi 6.8.21	Št 23.9.21																		
SO 430.1.6.3 Rozdeľovací objekt DN	Pi 3.9.21	Št 14.10.21																		
SO 430.1.6.4 Memný žlab na odtoku	Pi 24.9.21	Št 28.10.21																		
SO 430.1.6.5 Memný domček na odtoku	Pi 24.9.21	Št 30.3.22																		
SO 430.1.6.6 Spojné a lomové šachty	Pi 15.10.21	Št 11.11.21																		
SO 430.1.7 Studňa užitkovej vody	Ut 29.6.21	Po 5.7.21																		
SO 430.1.7 Studňa užitkovej vody	Ut 29.6.21	Po 5.7.21																		
SO 430.1.8 Zastrešenie hrubého predčistenia	Pi 3.9.21	Št 14.10.21																		
SO 430.1.8 Zastrešenie hrubého predčistenia	Pi 3.9.21	Št 14.10.21																		
SO 430.2.1 Potrubné rozvody v areáli ČOV	Ut 6.7.21	Št 17.11.21																		
SO 430.2.1.1 Kanalizácia v ČOV	Ut 6.7.21	Po 2.8.21																		
SO 430.2.1.2 Vodovod pitný a užitkový	Ut 3.8.21	Po 6.9.21																		
SO 430.2.1.3 Kalové potrubia	Ut 7.9.21	Št 6.10.21																		
SO 430.2.1.4 Vzduchové potrubia	Št 7.10.21	Št 17.11.21																		

Súhrn projektu Súhrn projektu
 Neaktívna úloha Neaktívna úloha
 Neaktívny medzník Neaktívny medzník
 Neaktívny súhrn Neaktívny súhrn
 Súhrn Súhrn
 Rozdeliť Rozdeliť
 Medzník Medzník
 Manuálny súhrn Manuálny súhrn
 Manuálny úloha Manuálny úloha
 Iba trvanie Iba trvanie
 Iba začiatok Iba začiatok
 Iba dokončiť Iba dokončiť
 Externé úlohy Externé úlohy
 Externý medzník Externý medzník
 Termín Termín
 Priebeh Priebeh
 Manuálny priebeh Manuálny priebeh

Projekt: HMG Pruské
 Dátum: Ut 9.2.21

Identifikačný kód	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Štvrť: 2, 2021 apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 3, 2021 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 4, 2021 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 1, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 2, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 3, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 4, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 1, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 2, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť: 3, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
82	SO 430.2.2 Pripojka pitnej vody	Po 5.9.22	Pi 25.11.22										
83	SO 430.2.2.2 Pripojka pitnej vody	Po 5.9.22	Pi 25.11.22										
84	SO 430.2.3 Pripojka pitnej vody	Po 22.11.21	Ut 15.3.22										
85	SO 430.2.3.3 Oblok	Po 22.11.21	Ut 15.3.22										
86	SO 430.3 Cesty, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy	Ut 8.6.21	Ut 18.4.23										
87	SO 430.3.1 Cesty a spevnené plochy	Št 27.10.22	Št 23.3.23										
88	SO 430.3.2 Prijazdová komunikácia k ČOV	Št 10.11.22	Ut 18.4.23										
89	SO 430.3.3 Terénne a sadové úpravy	Ut 8.6.21	Str 5.4.23										
90	SO 430.4 Oplotenie	Pi 17.3.23	Št 13.4.23										
91	SO 430.4 Oplotenie	Pi 17.3.23	Št 13.4.23										
92	SO 430.5 Odtok z ČOV a výustný objekt	Št 31.3.22	Str 8.6.22										
93	SO 430.5 Odtok z ČOV a výustný objekt	Št 31.3.22	Str 8.6.22										
94	SO 430.6 Pripojka VN a trafostanica	Po 5.9.22	Str 30.11.22										
95	SO 430.6a Pripojka VN	Po 5.9.22	Pi 25.11.22										
96	SO 430.6b Kiosková trafostanica	Št 24.11.22	Str 30.11.22										
97	SO 430.7 Stavebná elektroinštalácia	Pi 13.8.21	Str 15.3.23										
98	SO 430.7 Stavebná elektroinštalácia	Pi 13.8.21	Str 15.3.23										
99	SO 430.8 Pretožka potoka	Ut 11.5.21	Po 28.6.21										
100	SO 430.8 Pretožka potoka	Ut 11.5.21	Po 28.6.21										
101	SO 430.9 Pretožka závlahového výtláčného potrubia	Ut 11.5.21	Po 21.6.21										
102	SO 430.9 Pretožka závlahového výtláčného potrubia	Ut 11.5.21	Po 21.6.21										
103	PS STG	Št 7.4.22	Str 15.3.23										
104	PS 406 Bohunice - ČS B9	Št 4.8.22	Pi 26.8.22										
105	PS 407 Bohunice - ČS B6	Str 14.9.22	Št 6.10.22										
106	PS 408 Bohunice - ČS B7	Str 23.11.22	Str 15.3.23										
107	PS 409 Pruské - ČS B8	Po 18.7.22	Ut 9.8.22										
108	PS 412 Bohunice - ČS B11	Št 7.4.22	Pi 29.4.22										
109	PS 410 ČOV Pruské	Pi 27.8.21	Ut 7.3.23										
110	PS 410.1 ČOV Pruské - Mechanická a biologická linka	Pi 27.8.21	Ut 7.3.23										
111	PS 410.2 ČOV Pruské - Kalové hospodárstvo	Pi 27.8.21	Ut 7.3.23										
112	PS ELEKTR	Po 2.5.22	Str 5.4.23										
113	PS 456 Bohunice - ČS B9	Po 29.8.22	Pi 16.9.22										
114	PS 457 Bohunice - ČS B6	Pi 7.10.22	Št 27.10.22										
115	PS 458 Bohunice - ČS B7	Št 16.3.23	Str 5.4.23										
116	PS 459 Pruské - ČS B8	Str 10.8.22	Ut 30.8.22										
117	PS 462 Bohunice - ČS B11	Po 2.5.22	Pi 20.5.22										
118	PS 460 ČOV Pruské	Pi 27.8.21	Str 30.11.22										
119	PS 460.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	Pi 27.8.21	Str 30.11.22										
120	PS 460.2 Meranie a regulácia	Pi 24.9.21	Str 30.11.22										
121	30% Finančné plnenie - do uplnutia 50% lehoty výstavby (milník č.1)	So 30.4.22	So 30.4.22										

Úloha Súhrn projektu Manuálna úloha Iba začiatok Iba dokončiť Termin
Rozdeliť Neaktívna úloha Iba trvanie Pribeh
Medzník Neaktívny medzník Manuálny súhrn Externý úlohy Manuálny príbeh
Súhrn Neaktívny súhrn Externý medzník


Identifikačný kód	Režim/Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Štvrť 2, 2021 apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 3, 2021 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 4, 2021 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 1, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 2, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 3, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 4, 2022 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 1, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 2, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.	Štvrť 3, 2023 jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
122	50% Finanačné plnenie - do uplnutia 70% lehoty výstavby (míľnik č.2)	Št 22.9.22	Št 22.9.22										
123	Dokončovacie práce	Ut 4.5.21	Pi 28.4.23										
124	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela	Str 29.3.23	Ut 18.4.23										
125	Plán užívania	Str 29.3.23	Ut 11.4.23										
126	Odstranenie zariadenia staveniska	Po 24.4.23	Št 27.4.23										
127	Odvodzadenie stavebného diela	Pi 28.4.23	Pi 28.4.23										
128	Ostatné prípravné (prevádzkové a stavebné práce)	Ut 4.5.21	Pi 28.4.23										

Projekt: HMG Pruské
Dátum: Ut 9.2.21

Stavba: Pruské – kanalizácia a čov

Nasadenie strojov (stĺpcový diagram)

	2021												2022												2023			
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.				
Stroje na zemné práce	8	12	12	14	14	15	13				13	14	14	14	13	14	14	13	13					9				
Zhutňovacie zariadenia	4	6	6	6	6	6	6				6	7	7	7	7	7	6	5	5					5				
Nákladné autá	10	14	14	12	13	12	13				13	15	15	16	14	12	11	12	13					11				
Ostatná mechanizácia	13	13	13	15	16	15	16				13	13	13	13	12	12	15	15	16					15				
Spolu	35	45	45	47	49	48	48				45	49	49	50	46	45	46	47	47	0	0	0	40					

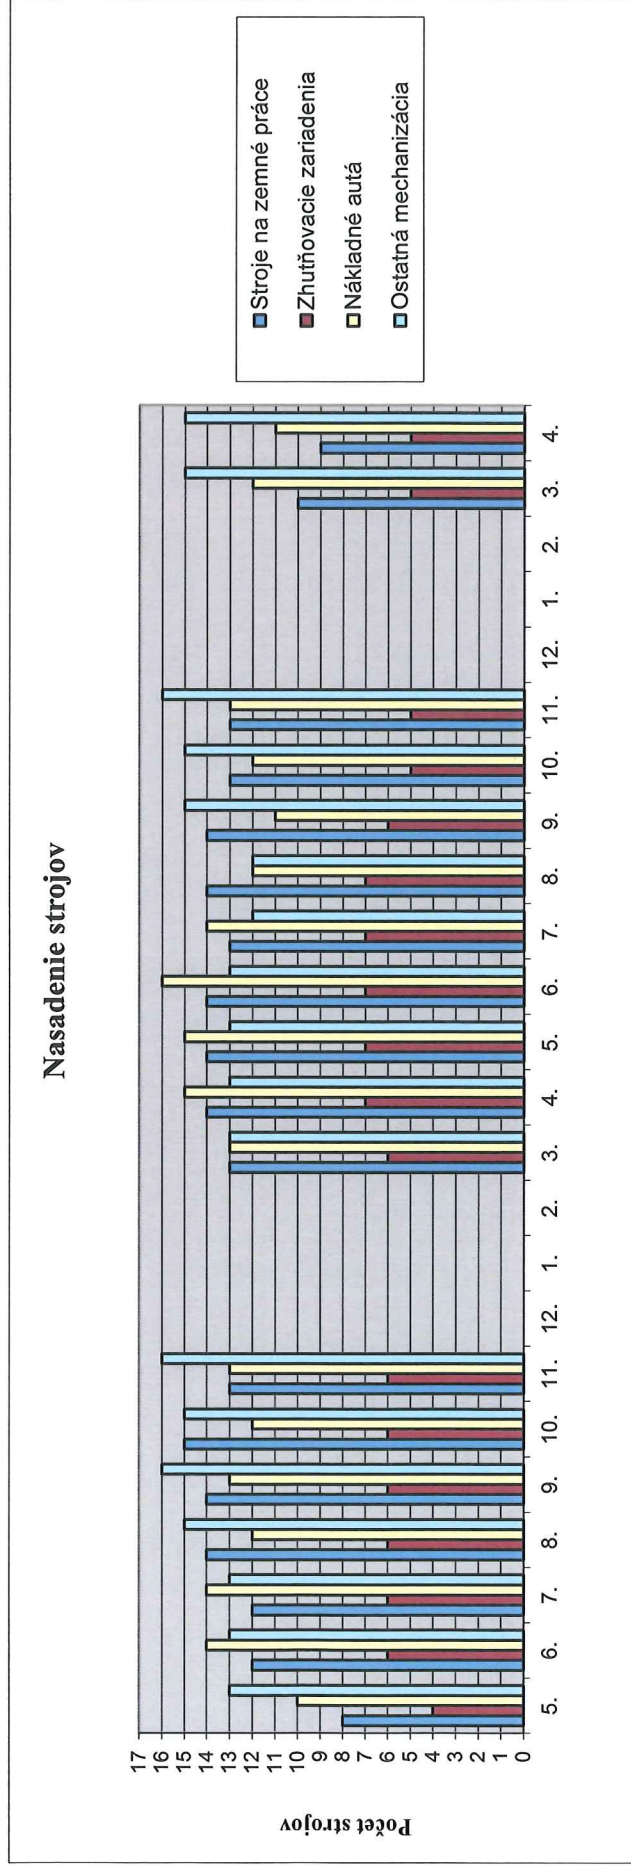

Stavba: Pruské – kanalizácia a čov

Nasadenie personálu (stĺpcový diagram)

Názov	2021												2022												2023					
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.						
Kalendárny mesiac																														
THP + majstri	3	4	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5						
Vodiči a strojníci	18	26	26	22	24	22	24				25	25	26	25	25	25	23	22	22				22	20						
Ostatní robotníci	10	22	23	27	27	27	27				24	28	30	32	30	30	25	25	25				20	16						
Montážnici technológie	0	2	3	7	7	7	6				7	7	7	7	7	10	12	12	15				15	6						
Total	31	54	57	61	63	61	62	2	2	2	61	65	68	69	67	70	65	64	67	2	2	2	62	47						

Nasadenie personálu

